

平成 30 年 7 月 19 日

下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

・下水道処理人口普及率を35.6%（H25当初）から41.5%（H29末）に増加させる。

上段：計画 下段：実施

全体事業費	合計 (A + B + C + D)
-------	-----------------------

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 下水道事業																			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H25	H26	H27	H28	H29				
東北処理区（単独公共）																			
A-1-1	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	東北6号污水幹線	φ150mm L=220m φ150mm L=177m	東北町						17 17			
A-1-2	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	外姥沢地区枝線	φ150mm L=820m φ150mm L=1356m	東北町						130 118			
A-1-3	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	明美地区枝線	φ150mm L=1,530m φ150mm L=736m	東北町						66 76			
A-1-4	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	全種	調査・設計等	管渠L=2,500m 等 管渠L=1,102m 等	東北町						26 29			
					-														

上北中央処理区（単独公共）																				
A-2-1	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	第2幹線	φ150～φ200mm L=730m φ150～φ200mm L=516m	東北町							101 125			
A-2-2	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	上野地区枝線	φ150mm L=2,520m φ150～φ200mm L=2,265m	東北町							367 381			
A-2-3	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	栄町地区枝線	φ150mm L=2,500m φ150mm L=602m	東北町							55 52			
A-2-4	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	全種	調査・設計等	管渠L=7,000m 等 管渠L=7,000m 等	東北町							139 139			
A-2-5	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	旭町地区枝線	φ150mm L=600m φ150mm L=199m	東北町							54 53			
A-2-6	下水道	一般	東北町	直接	-	分流	新設	南町地区枝線	φ150mm L=300m φ150mm L=0m	東北町							23 0			
(下水道事業)																	978			
合計																	990			
B 関連社会資本整備事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考		
										H25	H26	H27	H28	H29						
合計																				
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考			

C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
東北処理区（単独公共）																
C-1-1	下水道	一般	東北町	直接	—	新設	外姥沢地区端部枝線（単独管）整備	φ 150mm L=50m φ 150mm L=114m	東北町			■ ■ ■ ■			6 7	
C-1-2	下水道	一般	東北町	直接	—	新設	明美地区端部枝線（単独管）整備	φ 150mm L=340m	東北町			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	0	H27. 3削除
C-1-3	下水道	一般	東北町	直接	—	新設	調査・設計等	管渠L=800m 等 管渠L=633m 等	東北町			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	6 2	
上北中央処理区（単独公共）																
C-2-1	下水道	一般	東北町	直接	—	新設	上野地区端部枝線（単独管）整備	φ 150mm L=400m φ 150mm L=388m	東北町			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	27 27	
C-2-2	下水道	一般	東北町	直接	—	新設	栄町地区端部枝線（単独管）整備	φ 150mm L=520m	東北町			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	0	H27. 3削除
C-2-3	下水道	一般	東北町	直接	—	新設	調査・設計等	管渠L=1,000m 等 管渠L=1,021m 等	東北町			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	16 7	
															55	
合 計															43	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C-1-1	基幹事業である枝線整備(A-1-2)と接続した端部枝線(単独管)整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上に資する。	
C-1-2	基幹事業である枝線整備(A-1-3)と接続した端部枝線(単独管)整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上に資する。	H27.3削除
C-1-3	基幹事業である調査・設計等(A-1-4)と一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。	
C-2-1	基幹事業である枝線整備(A-2-2)と接続した端部枝線(単独管)整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上に資する。	
C-2-2	基幹事業である枝線整備(A-2-3)と接続した端部枝線(単独管)整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上に資する。	H27.3削除
C-2-3	基幹事業である調査・設計等(A-2-4)と一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)	105. 50	82. 02	109. 50	119. 50	100. 00
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	105. 50	82. 02	109. 50	119. 50	100. 00
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	14	0
支払済額 (e)	105. 50	82. 02	95. 50	133. 50	100. 00
翌年度繰越額 (f)	0. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	－	－	－	－	－

※ 平成25年度以降の各年度の決算額を記載。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・平成25年度から平成29年度までの下水道整備面積が、331.6haから387.9haに増加し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することができた。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	41.5%	目標値と実績値 に差が出た要因	・現場状況により、当初計画策定時よりも整備コストが増加し面整備の進捗が遅れ、また整備区域内の人口が当初の予測値よりも下回ったため、目標が未達となった。
		最終実績値	41.2%		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		・整備区域の生活環境の改善とトイレの水洗化の促進に寄与することができた。			


3. 特記事項（今後の方針等）

・今後も計画的に下水道整備を行い、下水道処理人口普及率の向上を図り、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。
--

東北町公共下水道事業計画（上北中央処理区）

一般平面図

S=N0 SCALE

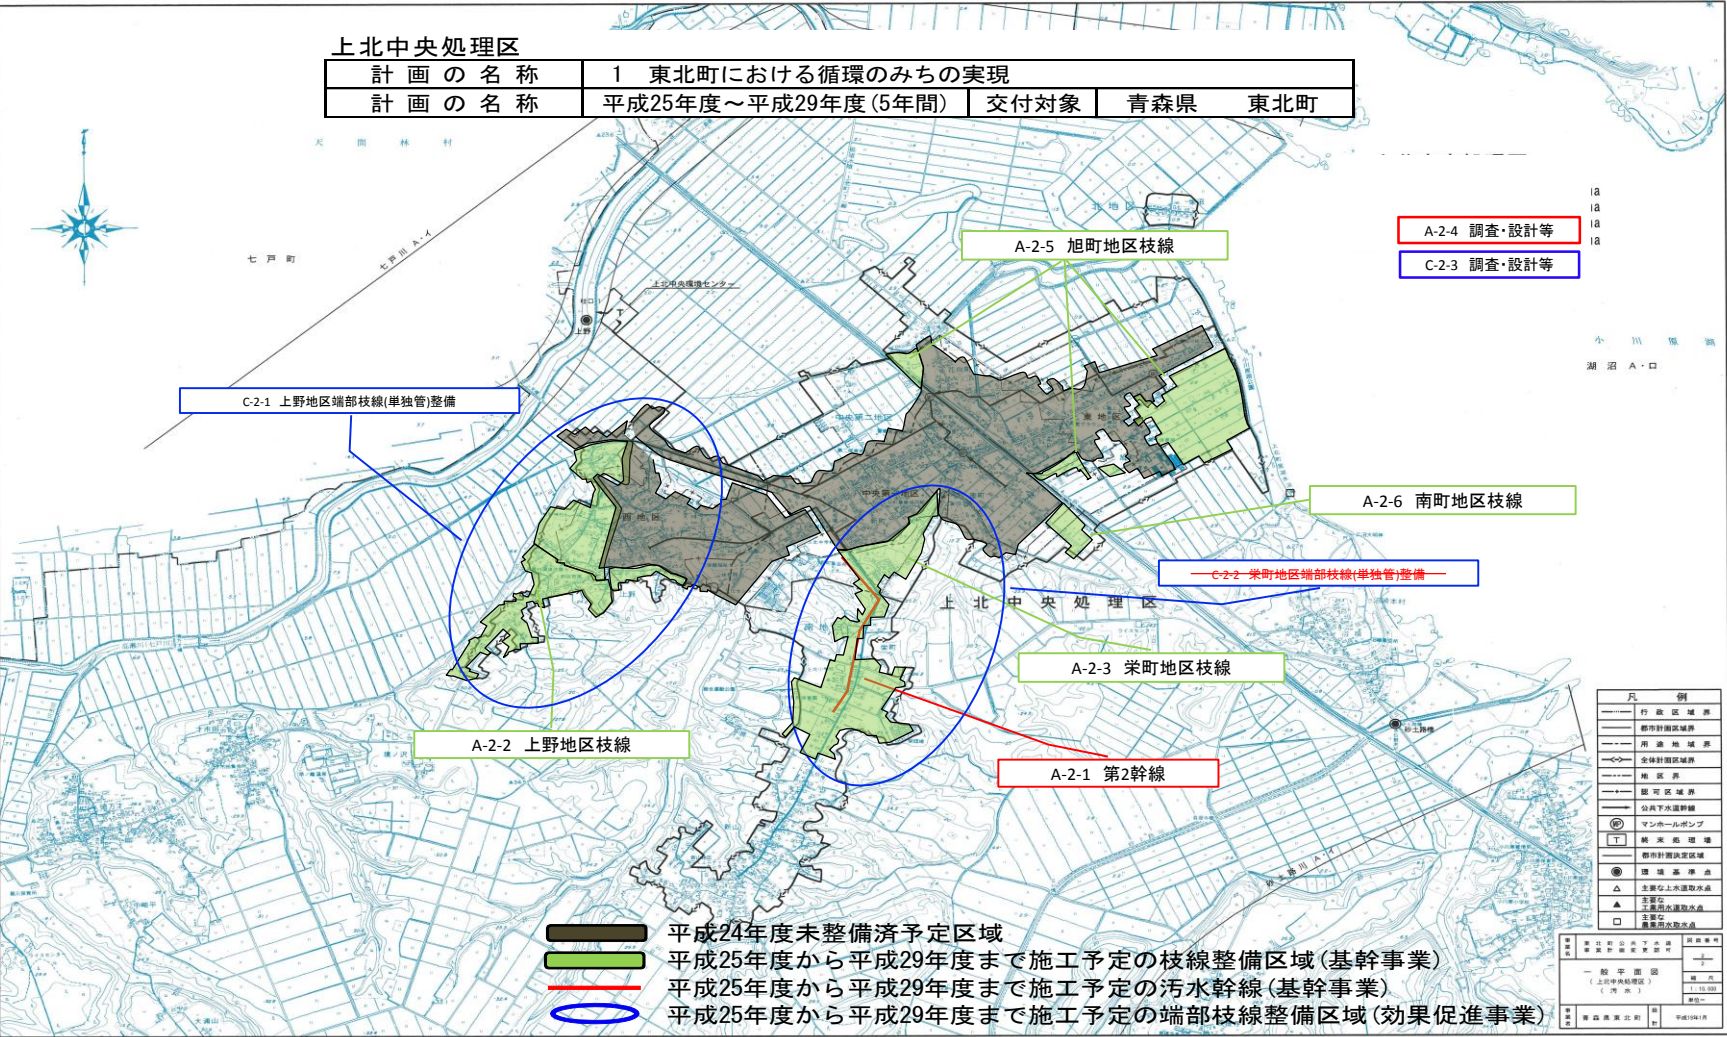

東北町公共下水道事業計画（東北処理区）

一般平面図 S=NO SCALE

